



Informe ejecutivo N° 18, revisión 0

Edificio Carrera

Agosto 2026

Cierre del período: 31-08-2026 · Emitido el
05-09-2026

Cliente

**Inmobiliaria Ruta
Desarrollo Cuatro SpA**

Constructora

Ingevec

Tipo de contrato

Suma alzada

Código de proyecto

GIP_228

Superficie

11.180,05 m²

Plazo contractual


**11-02-2025 al
11-02-2027**



Fachada interior, cierre de agosto 2026

Dónde está la obra al cierre de agosto 2026

Con el 77,5% del plazo transcurrido, la obra lleva 67,6% ejecutado: +0,95 pp sobre el programa, equivalente a 5 días de adelanto. Lo certificado en estados de pago (68,3%) va 0,64 pp sobre el avance físico.

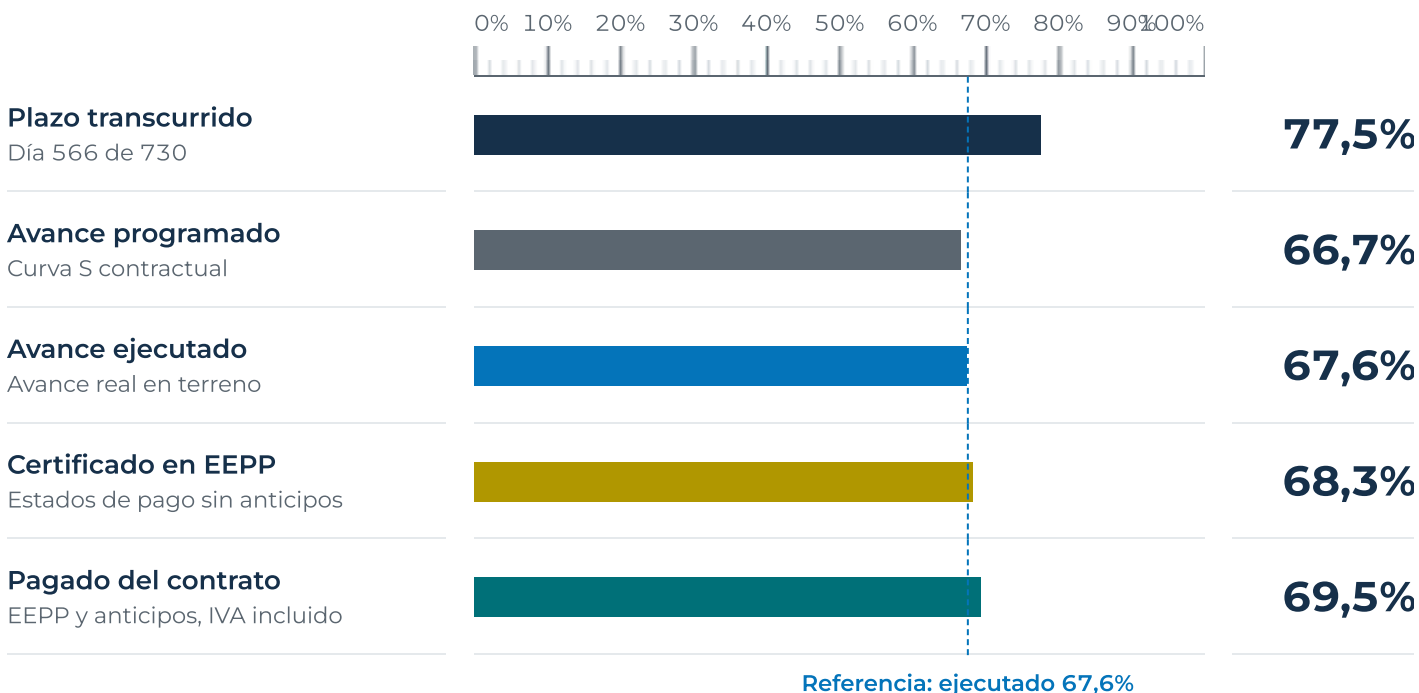

Semáforo de gestión

Verde
Avance físico vs programa
Ejecutado 67,6% vs programado 66,7% (+0,95 pp, 5 días de adelanto)
Verde
Avance certificado en EEPP vs físico
Certificado en estados de pago 68,3% vs avance físico 67,6% (+0,64 pp)
Amarillo
Hitos contractuales
Obra gruesa terminada el 23-04-2026, 48 días antes de lo programado (10-06-2026); recepción provisoria sin fecha informada por la constructora
Verde
Obras adicionales
Aprobados UF 2.338,77 netos (0,72% del contrato neto); saldo por pagar UF 404,65
Verde
Cierre de RDI
Tasa de cierre 97,7%, con 7 pendientes de 303
Verde
Seguridad
Sin accidentes registrados durante agosto

Contrato y garantías

Contrato a suma alzada con Ingevec, por 350.450 UF IVA incluido y un plazo de 730 días. Restan 164 días para el término.

Cliente	Inmobiliaria Ruta Desarrollo Cuatro SpA	Fecha de inicio	11-02-2025
Constructora	Ingevec	Fecha de término	11-02-2027
Descripción de la obra	Edificio Carrera	Plazo de ejecución	730 días
Tipo de contrato	Suma alzada	Días restantes	164 días
Tipo de obra	Construcción	Plazo transcurrido	77,5%
Código	GIP_228	Atraso	Sin atraso
Superficie	11.180,05 m²	Monto del contrato (IVA incl.)	350.450,13 UF

Composición del monto contratado

Concepto	UF	% del neto
Costo directo	266.348,29	81,6%
Gastos generales	38.519,04	11,8%
Gasto de oficina (4%)	12.194,69	3,7%
Utilidades (3%)	9.146,02	2,8%
Monto neto	326.208,05	100,0%
IVA (19%)	61.979,53	19,0%
Crédito especial empresas constructoras (CEEC)	-37.737,44	-11,6%
Monto total del contrato (IVA incl.)	350.450,13	107,4%

Pólizas de seguro

Aseguradora	N° de póliza	Materia asegurada	Monto	Vigencia
Mapfre	205-24-00007259	Responsabilidad civil	20.000 UF	15-10-2024 al 15-02-2028
Mapfre	205-24-00007259	Todo riesgo de construcción	350.450 UF	15-10-2024 al 15-02-2028

La vigencia incluye el período de mantenimiento.

Garantías y retenciones

Anticipo otorgado (neto) 47.857,34 UF Dos anticipos de 23.928,67 UF	Anticipo amortizado 68,1% 32.584,29 UF devueltos en EEPP	Por amortizar 15.273,05 UF Saldo neto del anticipo	Retenido a la fecha 11.131,92 UF 63,5% de la retención contractual
--	---	---	---

6 de 10 boletas de anticipo vigentes (30.848,34 UF). 4 boletas devueltas a la constructora a medida que se amortiza el anticipo.

Institución	N° de boleta	Concepto	Vencimiento	Monto	Estado
AVLA	3012024201547 a 3012024201558	Anticipo (10 boletas de 5.141,39 UF)	22-01-2027	51.413,90 UF	4 devueltas, 6 vigentes
AVLA	3012024201545	Fiel cumplimiento de contrato	19-02-2027	17.522,51 UF	En poder de la inmobiliaria
—	—	Retención contractual (5% del monto total)	—	17.522,51 UF	11.131,92 UF retenidos a la fecha

La boleta de fiel cumplimiento vence 8 días después del término contractual (11-02-2027) y las de anticipo vencen 20 días antes. Las retenciones se devuelven contra recepción provisoria y recepción definitiva.

Avance físico

Ejecutado 67,61% contra 66,66% programado: 5 días de adelanto. Para terminar en plazo debe avanzar 5,9% por mes.

● Verde: avance físico vs programa

Programado a la fecha 66,66% Curva S contractual	Ejecutado a la fecha 67,61% Avance real en terreno	Desviación +0,95 pp 5 días de adelanto	Plazo transcurrido 77,5% Día 566 de 730
---	---	---	--


Ritmo para terminar en plazo

Avance necesario por mes

5,9%

Promedio hasta el 11-02-2027

Es el avance promedio que la obra debe lograr cada mes, desde el cierre hasta el 11-02-2027, para llegar al 100% en la fecha de término.

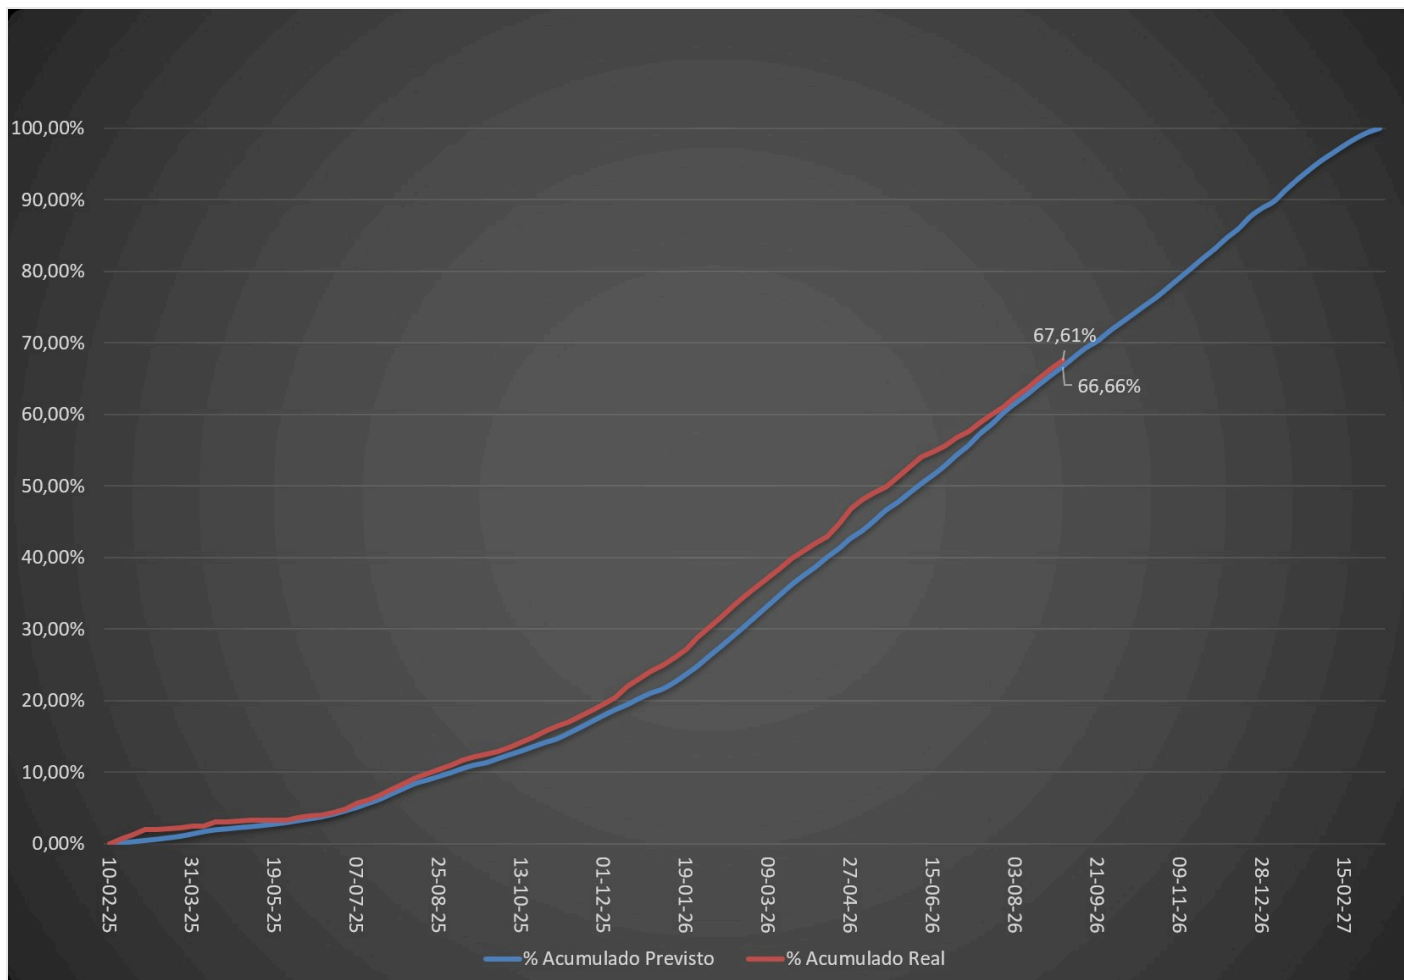

Curva S de avance físico al 28-08-2026. Azul: % acumulado previsto. Rojo: % acumulado real.

El avance real se ha mantenido sobre la línea prevista desde mediados de 2025. Al cierre quedan 32,39% de obra por ejecutar en 164 días.

Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 69,5% del contrato (243.428 UF IVA incluido, con 51.414 UF de anticipos). Quedan 107.022 UF por pagar.

● Verde: avance certificado en EEPP vs físico

14,7%	54,8%	30,5%
Anticipos 51.414 UF 14,7% del contrato	Estados de pago 192.014 UF 54,8% del contrato	Saldo por pagar 107.022 UF 30,5% del contrato

Detalle del contrato

Concepto	UF	Pesos	% del contrato
Monto total del contrato (IVA incl.)	350.450,13 UF	—	100,0%
Monto neto del contrato	326.208,05 UF	—	93,1%
Anticipos facturados (IVA incl.)	51.413,85 UF	—	14,7%
Estados de pago facturados (IVA incl., neto de devoluciones y retenciones)	192.014,36 UF	—	54,8%
Pagado en estados de pago y anticipos	243.428,21 UF	\$ 9.658.517.662	69,5%
Saldo por pagar (IVA incl.)	107.021,92 UF	—	30,5%
Obras adicionales a la fecha (IVA incl.)	2.494,30 UF	—	0,7%

El saldo por pagar incluye las retenciones acumuladas (11.131,92 UF netas), que se devuelven contra recepción.

Avance físico frente al financiero

Indicador	Valor	Referencia
Avance programado a la fecha	66,66%	Curva S contractual
Avance ejecutado a la fecha	67,61%	Avance real en terreno
Desviación física	+0,95 pp	Adelanto de 5 días
Avance certificado en estados de pago	68,25%	222.638 UF brutos en EEPP, sin anticipos, sobre el monto neto
Brecha certificado vs físico	+0,64 pp	Dentro de ±2 pp
Anticipo amortizado	68,1%	Devolución proporcional en cada estado de pago
Pagado del contrato (EEPP y anticipos)	69,46%	IVA incluido
Plazo transcurrido	77,5%	Día 566 de 730


Estados de pago

En el período se cursaron EEPP 19 CEEC (factura N° 42372) y EEPP 12 sin CEEC (factura N° 42371), por 17.661,45 UF IVA incluido (\$ 721.634.006).

Los estados de pago se facturan en dos series: con crédito especial a empresas constructoras (CEEC) y sin él.

EEPP con CEEC 19 Último emitido: EEPP 19 CEEC	EEPP sin CEEC 12 Facturados en paralelo desde sep-2025	Anticipos cursados 2 47.857,34 UF netos	Facturado en el período 17.661,45 UF \$ 721.634.006
--	---	--	--

Facturado por mes y pagado acumulado

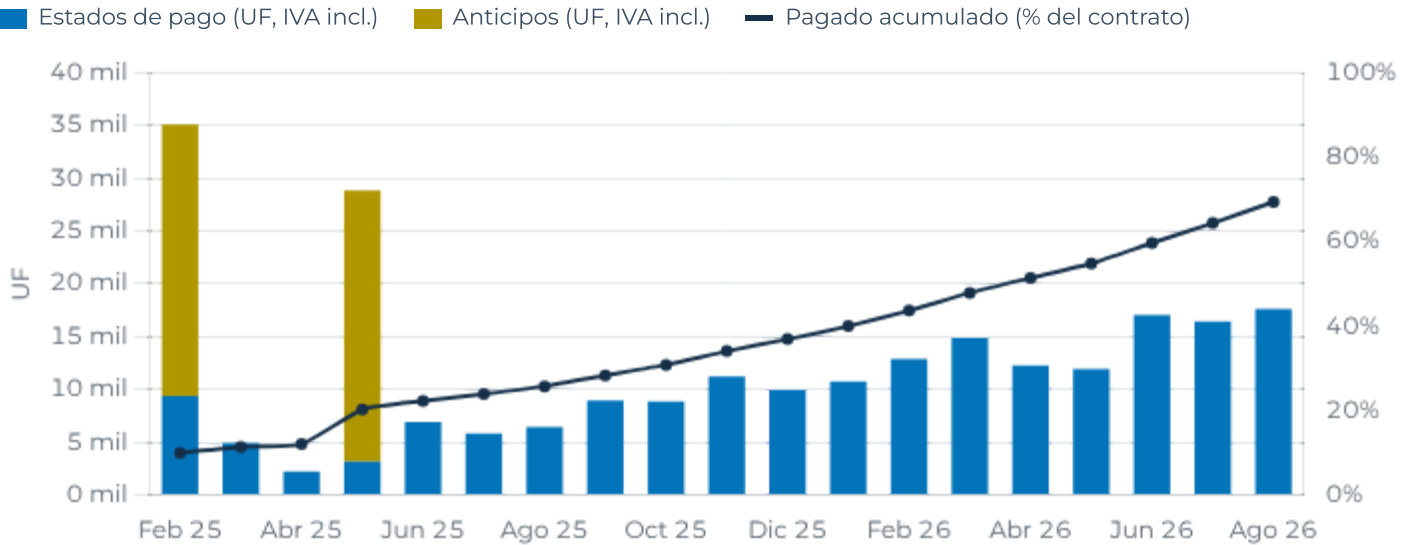

Abril de 2025 incluye la nota de crédito 1 CEEC (-7.599,28 UF), descontada del EEPP 3 del mismo mes.

Concepto	UF	Detalle
Monto bruto facturado	270.495,66	Estados de pago y anticipos
Devolución de anticipos	-32.584,29	68,1% del anticipo amortizado
Retenciones	-11.131,92	5% de cada estado de pago
Monto neto	226.779,45	
IVA (19%)	43.088,10	
Crédito especial CEEC (65% del IVA)	-26.439,34	Solo en la serie con CEEC
Total pagado (IVA incl.)	243.428,21	69,46% del contrato · \$ 9.658.517.662

Detalle de los 36 documentos de pago

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
Anticipo 1 CEEC	11-02-2025	40224	22.414,52	—	—	23.905,09	6,8%

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
Anticipo 1 sin CEEC	11-02-2025	40225	1.514,15	—	—	1.801,84	7,3%
EEPP 1 CEEC	26-02-2025	40343	10.065,52	738,35	503,28	9.410,68	10,0%
EEPP 2 CEEC	24-03-2025	40401	5.272,05	386,73	263,60	4.929,07	11,4%
EEPP 3 CEEC	20-04-2025	40551	10.540,18	773,16	527,01	9.854,47	14,2%
Nota de crédito 1 CEEC	20-04-2025	3999	-8.128,07	-596,23	-406,40	-7.599,28	12,1%
Anticipo 2 CEEC	20-05-2025	40643	22.414,52	—	—	23.905,09	18,9%
Anticipo 2 sin CEEC	20-05-2025	40644	1.514,15	—	—	1.801,84	19,4%
EEPP 4 CEEC	20-05-2025	40649	3.391,08	248,75	169,55	3.170,47	20,3%
EEPP 5 CEEC	20-06-2025	40735	8.165,75	1.261,44	408,29	6.928,01	22,3%
EEPP 6 CEEC	21-07-2025	40854	6.866,38	1.060,71	343,32	5.825,60	24,0%
EEPP 7 CEEC	20-08-2025	40961	7.636,21	1.179,63	381,81	6.478,74	25,8%
EEPP 8 CEEC	20-09-2025	41066	9.273,15	1.432,50	463,66	7.867,57	28,0%
EEPP 1 sin CEEC	20-09-2025	41065	1.161,88	170,46	58,09	1.110,66	28,4%
EEPP 9 CEEC	20-10-2025	41158	8.286,51	1.280,09	414,33	7.030,47	30,4%
EEPP 2 sin CEEC	20-10-2025	41167	1.920,36	281,73	96,02	1.835,70	30,9%
EEPP 10 CEEC	20-11-2025	41265	9.856,93	1.522,68	492,85	8.362,85	33,3%
EEPP 3 sin CEEC	20-11-2025	41266	3.008,54	441,38	150,43	2.875,92	34,1%
EEPP 11 CEEC	20-12-2025	41414	11.432,82	1.766,13	571,64	9.699,87	36,9%
EEPP 4 sin CEEC	20-12-2025	41413	272,87	40,03	13,64	260,84	36,9%
EEPP 12 CEEC	20-01-2026	41499	12.244,28	1.891,48	612,21	10.388,33	39,9%
EEPP 5 sin CEEC	20-01-2026	41500	397,96	58,38	19,90	380,42	40,0%
EEPP 13 CEEC	20-02-2026	41616	14.356,50	2.217,77	717,82	12.180,39	43,5%
EEPP 6 sin CEEC	20-02-2026	41615	741,38	108,77	37,07	708,69	43,7%
EEPP 14 CEEC	20-03-2026	41709	17.028,34	2.630,51	851,42	14.447,25	47,8%
EEPP 7 sin CEEC	20-03-2026	41710	441,28	64,74	22,06	421,83	47,9%
EEPP 15 CEEC	20-04-2026	41951	13.937,56	2.153,05	696,88	11.824,95	51,3%
EEPP 8 sin CEEC	20-04-2026	41952	481,50	70,64	24,08	460,28	51,4%
EEPP 16 CEEC	20-05-2026	42049	13.428,33	2.074,39	671,42	11.392,91	54,7%

Documento	Fecha	Factura	Bruto (UF)	Dev. anticipo	Retención	Total c/IVA (UF)	Acum. % contrato
EEPP 9 sin CEEC	20-05-2026	42048	600,86	88,15	30,04	574,38	54,9%
EEPP 17 CEEC	20-06-2026	42172	19.319,30	2.984,42	965,97	16.390,95	59,5%
EEPP 10 sin CEEC	20-06-2026	42171	718,04	105,34	35,90	686,38	59,7%
EEPP 18 CEEC	20-07-2026	42271	18.315,51	2.829,35	915,78	15.539,31	64,2%
EEPP 11 sin CEEC	20-07-2026	42269	957,39	140,46	47,87	915,19	64,4%
EEPP 19 CEEC	20-08-2026	42372	19.315,21	2.983,79	965,76	16.387,48	69,1%
EEPP 12 sin CEEC	20-08-2026	42371	1.332,72	195,52	66,64	1.273,97	69,5%
Total			270.495,66	32.584,29	11.131,92	243.428,21	69,5%

Fuente: anexo A.3, estados de pago con IVA crédito especial, visado por GIP.

Obras adicionales

La constructora ha presentado 19 adicionales por 5.307,27 UF netos y se han aprobado 2.338,77 UF (44,1% de lo presentado). En el período se cursó el EEPP OO.AA. 07 por 1.002,33 UF IVA incluido.

● Verde: obras adicionales

Presentado (neto) 5.307,27 UF 19 solicitudes	Aprobado (neto) 2.338,77 UF 0,72% del contrato neto	Total con IVA y CEEC 2.494,30 UF 0,71% del contrato	Saldo por pagar 404,65 UF Pagado 2.089,65 UF
---	--	--	---

● 17 aprobados ● 1 rechazado ● 1 eliminado

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
1	Cálculo	Refuerzo de muros perimetrales del proyecto	240,55	91,90	38%	Aprobado
2	Cálculo	Cambio de hormigón de G20 a G25	731,44	0,00	—	Eliminado
3	Cálculo	Demolición de viga de contención y fundación de muro medianero	200,39	181,62	91%	Aprobado
4	Arquitectura	Cambio de cantería de baño por cornisa	-29,65	-32,62	—	Aprobado

N°	Especialidad	Concepto	Presentado (UF)	Aprobado (UF)	% aprobado	Estado
5	Mecánica de suelos	Sobreexcavación y rellenos en fundaciones	161,40	0,00	—	Rechazado
6	Cálculo	Modificación de losa del 1° subterráneo	363,00	345,26	95%	Aprobado
7	Sanitario	Empalme UD y alcantarillado	184,07	184,07	100%	Aprobado
8	Sanitario	Estanque de agua de bomberos	412,70	210,27	51%	Aprobado
9	Impermeabilización	Junta de dilatación de piscina	40,96	40,96	100%	Aprobado
10	Sala de ventas	Motor de cortina de sala de ventas	59,21	59,21	100%	Aprobado
11	Arquitectura	Cambio de tina a receptáculo en deptos. tipo 1, 3, 5 y 8	507,32	507,32	100%	Aprobado
12	Gastos generales	Costo directo de obras extraordinarias N° 5 y N° 9	1.500,00	212,68	14%	Aprobado
13	Bomberos	Estanque de agua de bomberos	421,70	38,63	9%	Aprobado
14	Gastos generales	Costos directos OO.AA. 05 y 09	56,87	42,16	74%	Aprobado
15	Arquitectura	Varios ventanas	242,52	242,52	100%	Aprobado
16	Arquitectura	Alarma de ventanas de dormitorios piso 2	37,71	37,71	100%	Aprobado
17	Ventas	Cierre de seguridad sala de ventas	14,89	14,89	100%	Aprobado
18	Ventas	Sala de ventas	126,31	126,31	100%	Aprobado
19	Arquitectura	Ventanas locales 9 al 13	35,88	35,88	100%	Aprobado
Total neto			5.307,27	2.338,77	44%	

Montos netos en UF. Al aprobado neto se suma IVA (444,37 UF) y se descuenta el crédito CEEC (288,84 UF), para un total de 2.494,30 UF.

Estados de pago de obras adicionales

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	IVA	Crédito CEEC	Total (UF)
EEPP OO.AA. 01	23-06-2025	40770	45,95	8,73	-5,67	49,01
EEPP OO.AA. 02	29-08-2025	40985	90,81	17,25	-11,22	96,85
EEPP OO.AA. 03	24-10-2025	41211	136,76	25,98	-16,89	145,85
EEPP OO.AA. 04	20-11-2025	41350	345,26	65,60	-42,64	368,22
EEPP OO.AA. 05	16-04-2026	41796	184,07	34,97	-22,73	196,31

Documento	Fecha	Factura	Neto (UF)	IVA	Crédito CEEC	Total (UF)
EEPP OO.AA. 06	20-07-2026	42274	216,67	41,17	-26,76	231,08
EEPP OO.AA. 07	20-08-2026	42373	939,83	178,57	-116,07	1.002,33
Total			1.959,35	372,28	-241,98	2.089,65

Requerimientos de información (RDI)

De 303 RDI emitidas, 296 están resueltas (97,7%). Quedan 7 pendientes de respuesta.

Verde: cierre de RDI

RDI emitidas 303 Al 31-08-2026	Resueltas 296 Tasa de cierre 97,7%	Pendientes 7 2,3% del total	Nulas 0
---	---	--	-------------------

Estado de las RDI

Resueltas		296 97,7%
Pendientes		7 2,3%
Nulas		0 0,0%

Calidad y seguridad

Durante el mes se revisaron pintura de fachada, trazados de tabiquería y terrazas, y se recibieron en R0 los departamentos del piso 2. No se registran accidentes durante el mes.

Verde: seguridad

Revisiones de calidad del período

- Se revisan los trabajos de pintura de la fachada interior.
- Se verifican los trazados de tabiquería del piso 12.
- Se realiza la recepción R0 de los departamentos del piso 2.
- Se inician las pruebas de hermeticidad en terrazas de departamentos del piso 8.

Seguridad e higiene

Accidentes en el mes 0 Agosto 2026	Estado Sin accidentes Registro de obra
---	---


No se registran accidentes durante el mes.

Hitos y hechos relevantes

La obra gruesa terminó el 23-04-2026, 48 días antes de la fecha programada (10-06-2026). La recepción provisoria aún no tiene fecha informada por la constructora.


● Amarillo: hitos contractuales

Hitos contractuales

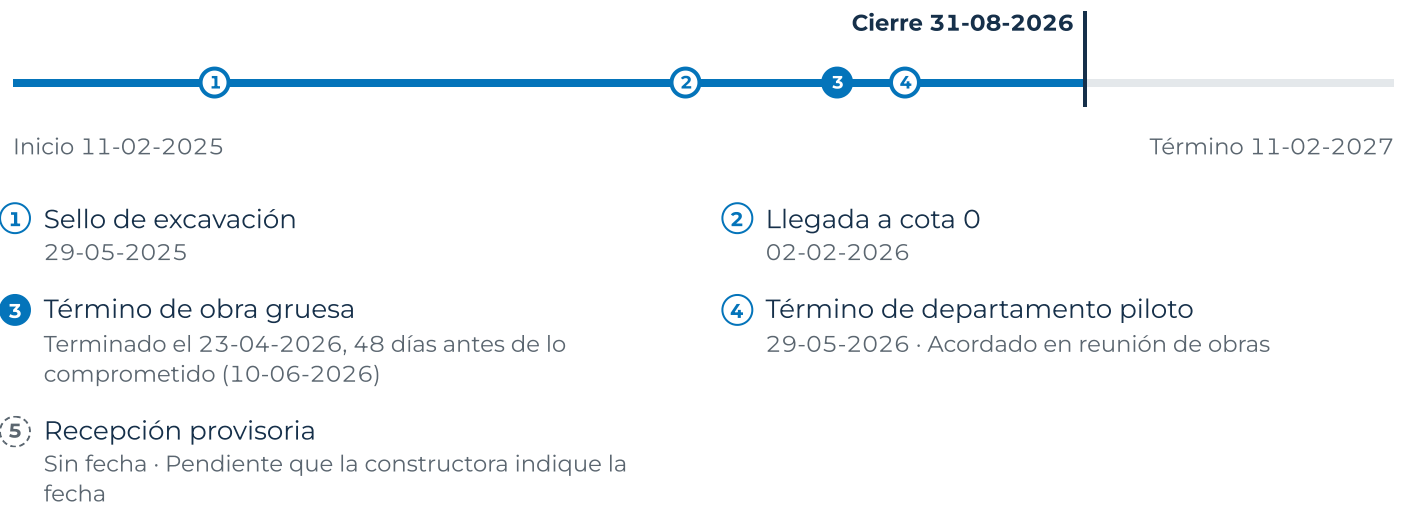

Los hitos rellenos están cumplidos y se ubican en su fecha real. Los hitos en azul tienen fecha comprometida anterior al cierre del período, sin fecha real registrada en el informe.

Hechos relevantes de agosto 2026

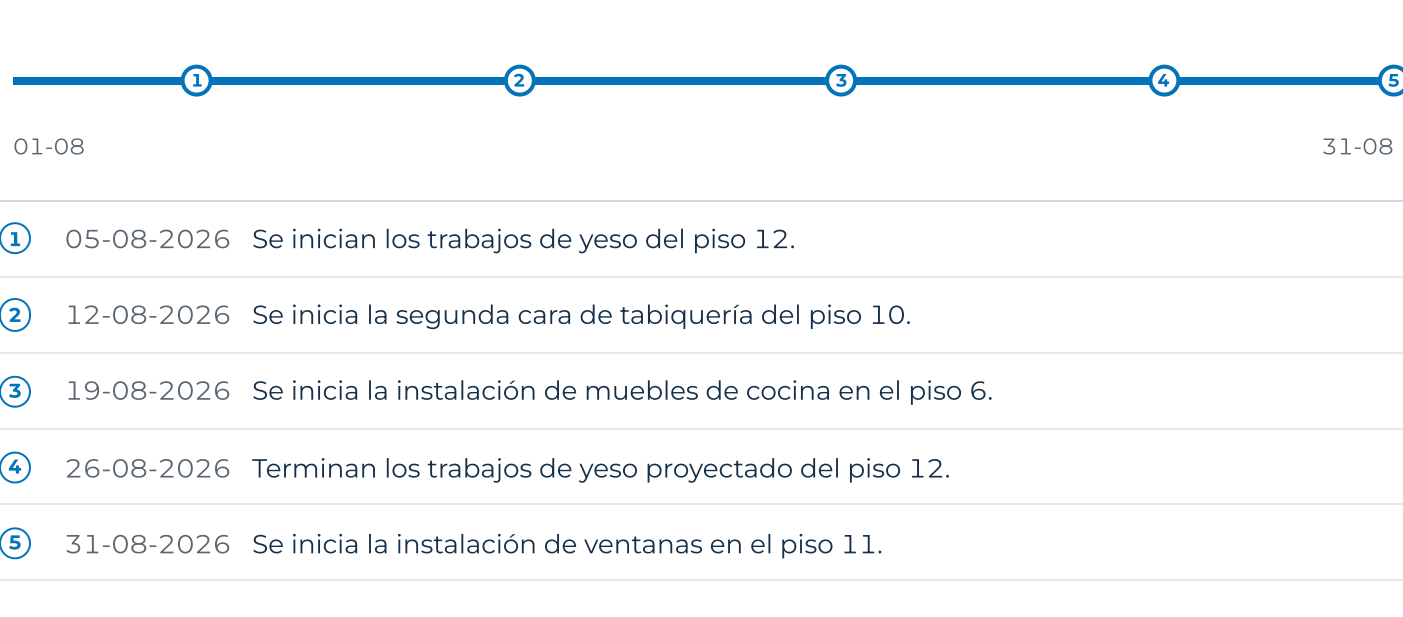

Registro fotográfico al 31-08-2026

8 fotografías del período. Las comparaciones muestran el mismo frente al

inicio y al final del mes. Seleccione una foto para ampliarla.

Avance durante el mes

Fachada interior



Inicio del mes



Final del mes

Cubierta



Inicio del mes




Final del mes

Faenas del período



Piso 5
Instalación de muebles de cocina

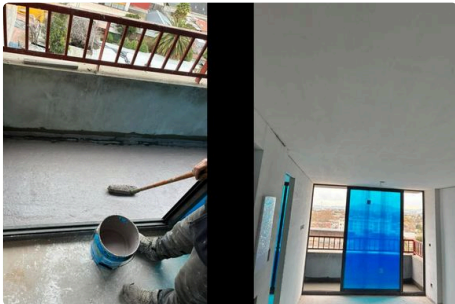

Piso 8
Impermeabilización de terrazas



Sector bomberos
Trabajos en sala de bomberos



Piso 3

Terminación de departamentos



INSPECCIÓN TÉCNICA
DE OBRAS

GIP Inspección Técnica de Obras

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago

contacto@gip.cl

Informe ejecutivo N° 18, revisión 0

Edificio Carrera (GIP_228)

Período agosto 2026, cierre 31-08-2026
