

Informe ejecutivo N° 19, revisión 0

# Edificio Carrera

## Septiembre 2026

Cierre del período: 30-09-2026 · Emitido el  
05-10-2026

Cliente

**Inmobiliaria Ruta  
Desarrollo Cuatro SpA**

Constructora

**Ingevec**

Tipo de contrato

**Suma alzada**

Código de proyecto

**GIP\_228**

Superficie

**11.180,05 m²**


Plazo contractual

**11-02-2025 al  
05-03-2027**

Fachada interior, cierre de septiembre 2026

## Dónde está la obra al cierre de septiembre 2026

Con el 79,3% del plazo transcurrido, la obra lleva 72,5% ejecutado: +0,87 pp sobre el programa, equivalente a 5 días de adelanto. Lo certificado en estados de pago (73,9%) va 1,45 pp sobre el avance físico.

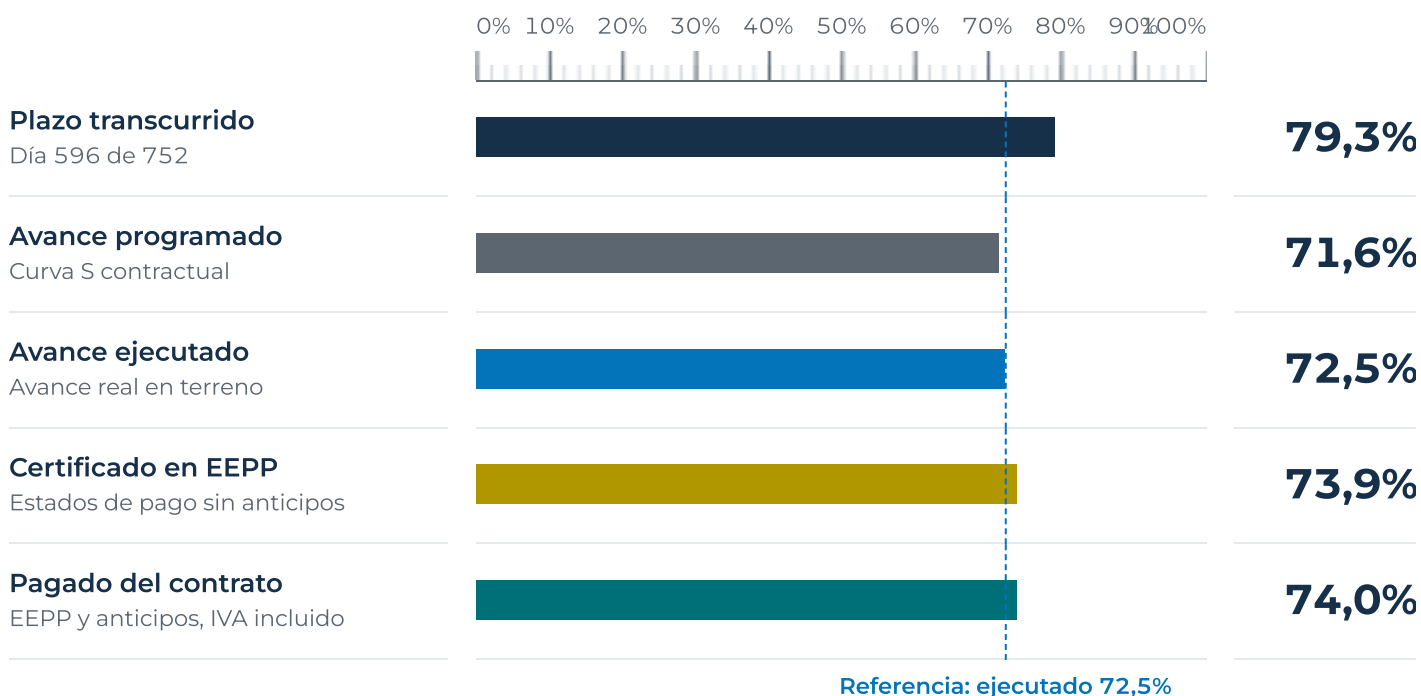

## Semáforo de gestión

|          |                                      |                                                                                                                                                |
|----------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verde    | Avance físico vs programa            | Ejecutado 72,5% vs programado 71,6% (+0,87 pp, 5 días de adelanto)                                                                             |
| Verde    | Avance certificado en EEPP vs físico | Certificado en estados de pago 73,9% vs avance físico 72,5% (+1,45 pp)                                                                         |
| Amarillo | Hitos contractuales                  | Obra gruesa terminada el 23-04-2026, 48 días antes de lo programado (10-06-2026); recepción provisoria sin fecha informada por la constructora |
| Amarillo | Vigencia de garantías                | Boletas de anticipo (22-01-2027) y de fiel cumplimiento (19-02-2027) vencen antes del nuevo término, 05-03-2027                                |
| Verde    | Obras adicionales                    | Aprobados UF 2.338,77 netos (0,72% del contrato neto); saldo por pagar UF 233,62                                                               |
| Verde    | Cierre de RDI                        | Tasa de cierre 96,0%, con 13 pendientes de 324                                                                                                 |
| Amarillo | Seguridad                            | Un accidente el 08-09 con 7 días perdidos; la obra acumula 2 accidentes y 7 días perdidos                                                      |

## Contrato y garantías

Contrato a suma alzada con Ingevec, por 350.450 UF IVA incluido y un plazo de 752 días, que incluye un aumento de 22 días. Restan 156 días para el término.

● Amarillo: vigencia de garantías

|              |                                         |                  |            |
|--------------|-----------------------------------------|------------------|------------|
| Cliente      | Inmobiliaria Ruta Desarrollo Cuatro SpA | Fecha de inicio  | 11-02-2025 |
| Constructora | Ingevec                                 | Fecha de término | 05-03-2027 |

|                        |                  |                                |                                       |
|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Descripción de la obra | Edificio Carrera | Plazo de ejecución             | 752 días                              |
| Tipo de contrato       | Suma alzada      | Aumento de plazo               | 22 días (término original 11-02-2027) |
| Tipo de obra           | Construcción     | Días restantes                 | 156 días                              |
| Código                 | GIP_228          | Plazo transcurrido             | 79,3%                                 |
| Superficie             | 11.180,05 m²     | Atraso                         | Sin atraso                            |
|                        |                  | Monto del contrato (IVA incl.) | 350.450,13 UF                         |

Composición del monto contratado

| Concepto                                       | UF         | % del neto |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Costo directo                                  | 266.348,29 | 81,6%      |
| Gastos generales                               | 38.519,04  | 11,8%      |
| Gasto de oficina (4%)                          | 12.194,69  | 3,7%       |
| Utilidades (3%)                                | 9.146,02   | 2,8%       |
| Monto neto                                     | 326.208,05 | 100,0%     |
| IVA (19%)                                      | 61.979,53  | 19,0%      |
| Crédito especial empresas constructoras (CEEC) | -37.737,44 | -11,6%     |
| Monto total del contrato (IVA incl.)           | 350.450,13 | 107,4%     |

Pólizas de seguro

| Aseguradora | N° de póliza    | Materia asegurada           | Monto      | Vigencia                 |
|-------------|-----------------|-----------------------------|------------|--------------------------|
| Mapfre      | 205-24-00007259 | Responsabilidad civil       | 20.000 UF  | 15-10-2024 al 15-02-2028 |
| Mapfre      | 205-24-00007259 | Todo riesgo de construcción | 350.450 UF | 15-10-2024 al 15-02-2028 |

La vigencia incluye el período de mantenimiento.

Garantías y retenciones

|                                                                                  |                                                                       |                                                                 |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Anticipo otorgado (neto)<br><b>47.857,34 UF</b><br>Dos anticipos de 23.928,67 UF | Anticipo amortizado<br><b>74,0%</b><br>35.434,86 UF devueltos en EEPP | Por amortizar<br><b>12.422,48 UF</b><br>Saldo neto del anticipo | Retenido a la fecha<br><b>12.059,16 UF</b><br>68,8% de la retención contractual |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



**6 de 10 boletas de anticipo vigentes** (30.848,34 UF). 4 boletas devueltas a la constructora a medida que se amortiza el anticipo.

| Institución | Nº de boleta                     | Concepto                                      | Vencimiento | Monto        | Estado                               |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| AVLA        | 3012024201547 a<br>3012024201558 | Anticipo (10 boletas de<br>5.141,39 UF)       | 22-01-2027  | 51.413,90 UF | 4 devueltas, 6<br>vigentes           |
| AVLA        | 3012024201545                    | Fiel cumplimiento de<br>contrato              | 19-02-2027  | 17.522,51 UF | En poder de la<br>inmobiliaria       |
| —           | —                                | Retención contractual (5%<br>del monto total) | —           | 17.522,51 UF | 12.059,16 UF<br>retenidos a la fecha |

La boleta de fiel cumplimiento vence 14 días antes del término contractual (05-03-2027) y las de anticipo vencen 42 días antes. Las retenciones se devuelven contra recepción provisoria y recepción definitiva.

## Avance físico

Ejecutado 72,49% contra 71,62% programado: 5 días de adelanto. Para terminar en plazo debe avanzar 5,3% por mes; en el último mes avanzó 4,9%.


Verde: avance físico vs programa

|                                                               |                                                                 |                                                     |                                                      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Programado a la fecha<br><b>71,62%</b><br>Curva S contractual | Ejecutado a la fecha<br><b>72,49%</b><br>Avance real en terreno | Desviación<br><b>+0,87 pp</b><br>5 días de adelanto | Plazo transcurrido<br><b>79,3%</b><br>Día 596 de 752 |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|

## Ritmo para terminar en plazo

|                                                                         |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Avance necesario por mes<br><b>5,3%</b><br>Promedio hasta el 05-03-2027 | Avance del último mes<br><b>4,9%</b><br>Del 31-08-2026 al 30-09-2026 |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|

Para terminar el 05-03-2027, la obra debe avanzar en promedio 5,3% por mes, más que el 4,9% logrado en el último mes.

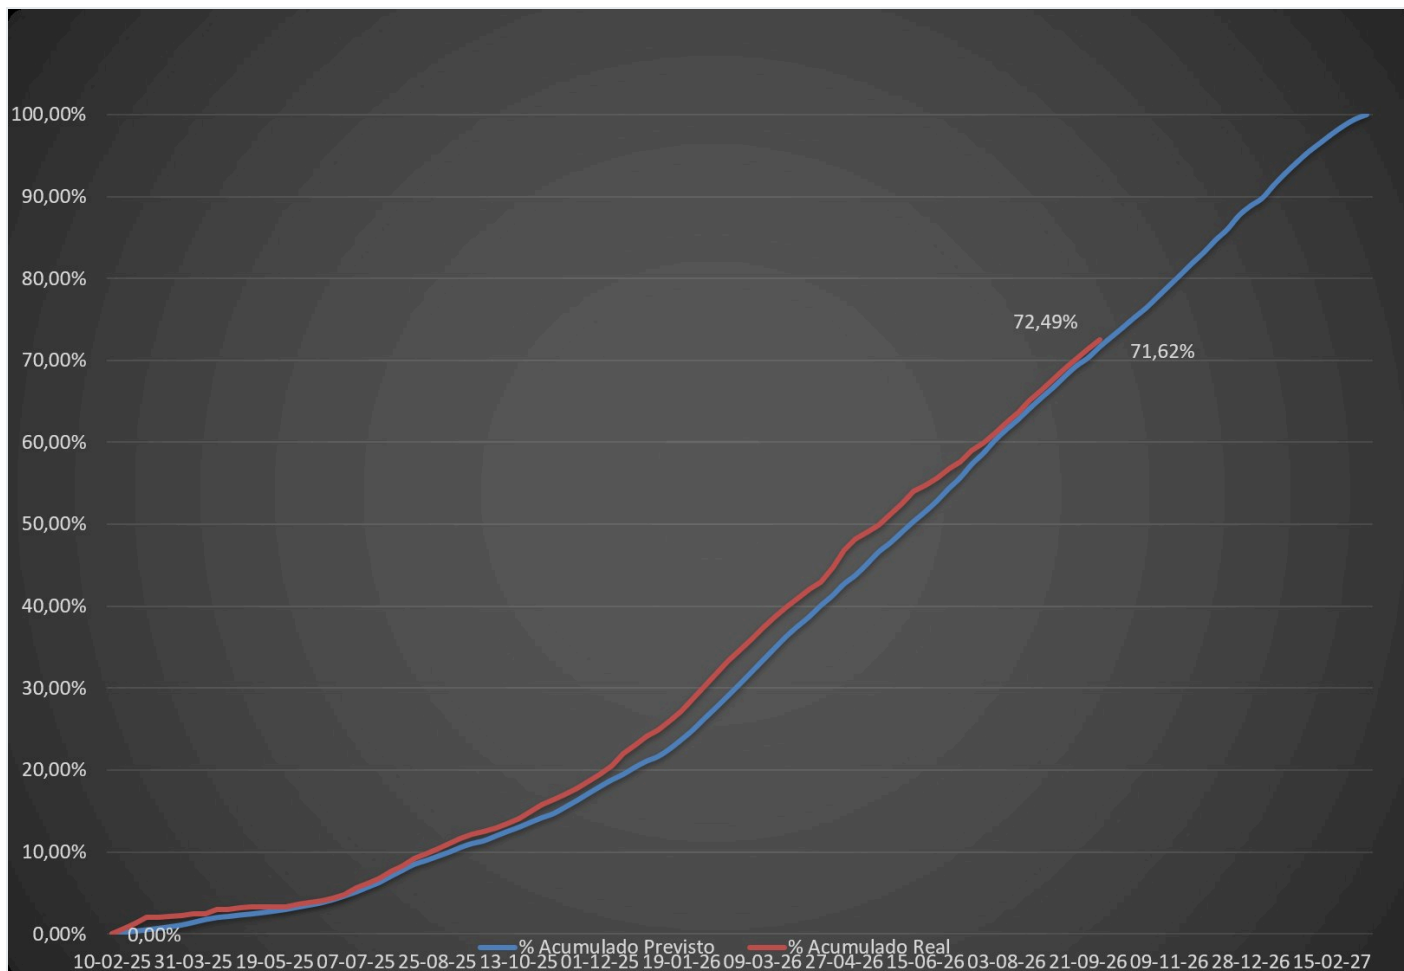

Curva S de avance físico al cierre del período. Azul: % acumulado previsto. Rojo: % acumulado real.

El avance real se mantiene sobre la línea prevista. Al cierre quedan 27,51% de obra por ejecutar en 156 días.

## Estado financiero del contrato

Se ha pagado el 74,0% del contrato (259.358 UF IVA incluido, con 51.414 UF de anticipos). Quedan 91.092 UF por pagar.

● Verde: avance certificado en EEPP vs físico

|                    |                    |                    |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 14,7%              | 59,3%              | 26,0%              |
| Anticipos          | Estados de pago    | Saldo por pagar    |
| <b>51.414 UF</b>   | <b>207.945 UF</b>  | <b>91.092 UF</b>   |
| 14,7% del contrato | 59,3% del contrato | 26,0% del contrato |

## Detalle del contrato

| Concepto                                                                   | UF                   | Pesos                    | % del contrato |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| Monto total del contrato (IVA incl.)                                       | 350.450,13 UF        | —                        | 100,0%         |
| Monto neto del contrato                                                    | 326.208,05 UF        | —                        | 93,1%          |
| Anticipos facturados (IVA incl.)                                           | 51.413,85 UF         | —                        | 14,7%          |
| Estados de pago facturados (IVA incl., neto de devoluciones y retenciones) | 207.944,65 UF        | —                        | 59,3%          |
| <b>Pagado en estados de pago y anticipos</b>                               | <b>259.358,50 UF</b> | <b>\$ 10.311.267.720</b> | <b>74,0%</b>   |
| Saldo por pagar (IVA incl.)                                                | 91.091,63 UF         | —                        | 26,0%          |
| Obras adicionales a la fecha (IVA incl.)                                   | 2.494,30 UF          | —                        | 0,7%           |

El saldo por pagar incluye las retenciones acumuladas (12.059,16 UF netas), que se devuelven contra recepción.

## Avance físico frente al financiero

| Indicador                              | Valor    | Referencia                                                    |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| Avance programado a la fecha           | 71,62%   | Curva S contractual                                           |
| Avance ejecutado a la fecha            | 72,49%   | Avance real en terreno                                        |
| Desviación física                      | +0,87 pp | Adelanto de 5 días                                            |
| Avance certificado en estados de pago  | 73,94%   | 241.183 UF brutos en EEPP, sin anticipos, sobre el monto neto |
| Brecha certificado vs físico           | +1,45 pp | Dentro de ±2 pp                                               |
| Anticipo amortizado                    | 74,0%    | Devolución proporcional en cada estado de pago                |
| Pagado del contrato (EEPP y anticipos) | 74,01%   | IVA incluido                                                  |
| Plazo transcurrido                     | 79,3%    | Día 596 de 752                                                |


## Estados de pago

En el período se cursaron EEPP 20 CEEC (factura N° 42495) y EEPP 13 sin CEEC (factura N° 42494), por 15.930,29 UF IVA incluido (\$ 652.750.058).

Los estados de pago se facturan en dos series: con crédito especial a empresas constructoras (CEEC) y sin él.

|                                                            |                                                                     |                                                      |                                                                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| EEPP con CEEC<br><b>20</b><br>Último emitido: EEPP 20 CEEC | EEPP sin CEEC<br><b>13</b><br>Facturados en paralelo desde sep-2025 | Anticipos cursados<br><b>2</b><br>47.857,34 UF netos | Facturado en el período<br><b>15.930,29 UF</b><br>\$ 652.750.058 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Facturado por mes y pagado acumulado

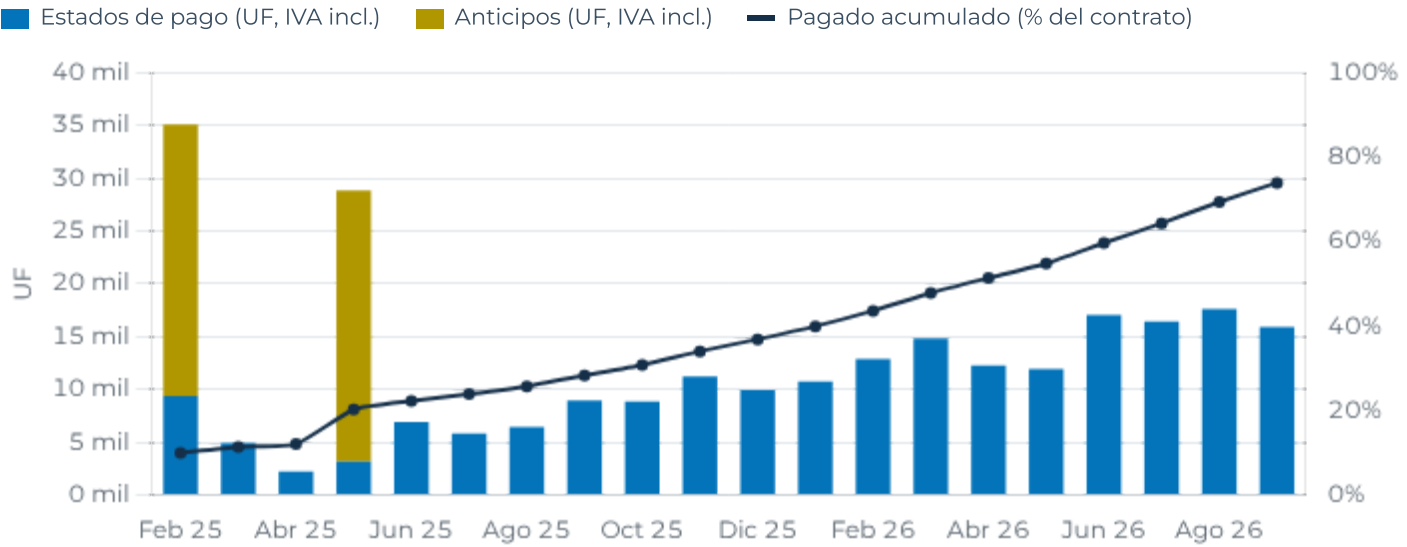

Abril de 2025 incluye la nota de crédito 1 CEEC (-7.599,28 UF), descontada del EEPP 3 del mismo mes.

| Concepto                            | UF                | Detalle                                        |
|-------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| Monto bruto facturado               | 289.040,47        | Estados de pago y anticipos                    |
| Devolución de anticipos             | -35.434,86        | 74,0% del anticipo amortizado                  |
| Retenciones                         | -12.059,16        | 5% de cada estado de pago                      |
| <b>Monto neto</b>                   | <b>241.546,45</b> |                                                |
| IVA (19%)                           | 45.893,83         |                                                |
| Crédito especial CEEC (65% del IVA) | -28.081,78        | Solo en la serie con CEEC                      |
| <b>Total pagado (IVA incl.)</b>     | <b>259.358,50</b> | <b>74,01% del contrato · \$ 10.311.267.720</b> |

Detalle de los 38 documentos de pago

| Documento       | Fecha      | Factura | Bruto (UF) | Dev. anticipo | Retención | Total c/IVA (UF) | Acum. % contrato |
|-----------------|------------|---------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Anticipo 1 CEEC | 11-02-2025 | 40224   | 22.414,52  | —             | —         | 23.905,09        | 6,8%             |

| Documento              | Fecha      | Factura | Bruto (UF) | Dev. anticipo | Retención | Total c/IVA (UF) | Acum. % contrato |
|------------------------|------------|---------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| Anticipo 1 sin CEEC    | 11-02-2025 | 40225   | 1.514,15   | —             | —         | 1.801,84         | 7,3%             |
| EEPP 1 CEEC            | 26-02-2025 | 40343   | 10.065,52  | 738,35        | 503,28    | 9.410,68         | 10,0%            |
| EEPP 2 CEEC            | 24-03-2025 | 40401   | 5.272,05   | 386,73        | 263,60    | 4.929,07         | 11,4%            |
| EEPP 3 CEEC            | 20-04-2025 | 40551   | 10.540,18  | 773,16        | 527,01    | 9.854,47         | 14,2%            |
| Nota de crédito 1 CEEC | 20-04-2025 | 3999    | -8.128,07  | -596,23       | -406,40   | -7.599,28        | 12,1%            |
| Anticipo 2 CEEC        | 20-05-2025 | 40643   | 22.414,52  | —             | —         | 23.905,09        | 18,9%            |
| Anticipo 2 sin CEEC    | 20-05-2025 | 40644   | 1.514,15   | —             | —         | 1.801,84         | 19,4%            |
| EEPP 4 CEEC            | 20-05-2025 | 40649   | 3.391,08   | 248,75        | 169,55    | 3.170,47         | 20,3%            |
| EEPP 5 CEEC            | 20-06-2025 | 40735   | 8.165,75   | 1.261,44      | 408,29    | 6.928,01         | 22,3%            |
| EEPP 6 CEEC            | 21-07-2025 | 40854   | 6.866,38   | 1.060,71      | 343,32    | 5.825,60         | 24,0%            |
| EEPP 7 CEEC            | 20-08-2025 | 40961   | 7.636,21   | 1.179,63      | 381,81    | 6.478,74         | 25,8%            |
| EEPP 8 CEEC            | 20-09-2025 | 41066   | 9.273,15   | 1.432,50      | 463,66    | 7.867,57         | 28,0%            |
| EEPP 1 sin CEEC        | 20-09-2025 | 41065   | 1.161,88   | 170,46        | 58,09     | 1.110,66         | 28,4%            |
| EEPP 9 CEEC            | 20-10-2025 | 41158   | 8.286,51   | 1.280,09      | 414,33    | 7.030,47         | 30,4%            |
| EEPP 2 sin CEEC        | 20-10-2025 | 41167   | 1.920,36   | 281,73        | 96,02     | 1.835,70         | 30,9%            |
| EEPP 10 CEEC           | 20-11-2025 | 41265   | 9.856,93   | 1.522,68      | 492,85    | 8.362,85         | 33,3%            |
| EEPP 3 sin CEEC        | 20-11-2025 | 41266   | 3.008,54   | 441,38        | 150,43    | 2.875,92         | 34,1%            |
| EEPP 11 CEEC           | 20-12-2025 | 41414   | 11.432,82  | 1.766,13      | 571,64    | 9.699,87         | 36,9%            |
| EEPP 4 sin CEEC        | 20-12-2025 | 41413   | 272,87     | 40,03         | 13,64     | 260,84           | 36,9%            |
| EEPP 12 CEEC           | 20-01-2026 | 41499   | 12.244,28  | 1.891,48      | 612,21    | 10.388,33        | 39,9%            |
| EEPP 5 sin CEEC        | 20-01-2026 | 41500   | 397,96     | 58,38         | 19,90     | 380,42           | 40,0%            |
| EEPP 13 CEEC           | 20-02-2026 | 41616   | 14.356,50  | 2.217,77      | 717,82    | 12.180,39        | 43,5%            |
| EEPP 6 sin CEEC        | 20-02-2026 | 41615   | 741,38     | 108,77        | 37,07     | 708,69           | 43,7%            |
| EEPP 14 CEEC           | 20-03-2026 | 41709   | 17.028,34  | 2.630,51      | 851,42    | 14.447,25        | 47,8%            |
| EEPP 7 sin CEEC        | 20-03-2026 | 41710   | 441,28     | 64,74         | 22,06     | 421,83           | 47,9%            |
| EEPP 15 CEEC           | 20-04-2026 | 41951   | 13.937,56  | 2.153,05      | 696,88    | 11.824,95        | 51,3%            |
| EEPP 8 sin CEEC        | 20-04-2026 | 41952   | 481,50     | 70,64         | 24,08     | 460,28           | 51,4%            |
| EEPP 16 CEEC           | 20-05-2026 | 42049   | 13.428,33  | 2.074,39      | 671,42    | 11.392,91        | 54,7%            |

| Documento        | Fecha      | Factura | Bruto (UF) | Dev. anticipo | Retención | Total c/IVA (UF) | Acum. % contrato |
|------------------|------------|---------|------------|---------------|-----------|------------------|------------------|
| EEPP 9 sin CEEC  | 20-05-2026 | 42048   | 600,86     | 88,15         | 30,04     | 574,38           | 54,9%            |
| EEPP 17 CEEC     | 20-06-2026 | 42172   | 19.319,30  | 2.984,42      | 965,97    | 16.390,95        | 59,5%            |
| EEPP 10 sin CEEC | 20-06-2026 | 42171   | 718,04     | 105,34        | 35,90     | 686,38           | 59,7%            |
| EEPP 18 CEEC     | 20-07-2026 | 42271   | 18.315,51  | 2.829,35      | 915,78    | 15.539,31        | 64,2%            |
| EEPP 11 sin CEEC | 20-07-2026 | 42269   | 957,39     | 140,46        | 47,87     | 915,19           | 64,4%            |
| EEPP 19 CEEC     | 20-08-2026 | 42372   | 19.315,21  | 2.983,79      | 965,76    | 16.387,48        | 69,1%            |
| EEPP 12 sin CEEC | 20-08-2026 | 42371   | 1.332,72   | 195,52        | 66,64     | 1.273,97         | 69,5%            |
| EEPP 20 CEEC     | 20-09-2026 | 42495   | 16.717,49  | 2.582,49      | 835,87    | 14.183,52        | 73,5%            |
| EEPP 13 sin CEEC | 20-09-2026 | 42494   | 1.827,32   | 268,08        | 91,37     | 1.746,77         | 74,0%            |
| Total            |            |         | 289.040,47 | 35.434,86     | 12.059,16 | 259.358,50       | 74,0%            |

Fuente: anexo A.3, estados de pago con IVA crédito especial, visado por GIP.

## Obras adicionales

La constructora ha presentado 19 adicionales por 5.307,27 UF netos y se han aprobado 2.338,77 UF (44,1% de lo presentado). En el período se cursó el EEPP OO.AA. 08 por 171,03 UF IVA incluido.

● Verde: obras adicionales

|                                                           |                                                                  |                                                                  |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Presentado (neto)<br><b>5.307,27 UF</b><br>19 solicitudes | Aprobado (neto)<br><b>2.338,77 UF</b><br>0,72% del contrato neto | Total con IVA y CEEC<br><b>2.494,30 UF</b><br>0,71% del contrato | Saldo por pagar<br><b>233,62 UF</b><br>Pagado 2.260,68 UF |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

● 17 aprobados ● 1 rechazado ● 1 eliminado

| N° | Especialidad | Concepto                                                       | Presentado (UF) | Aprobado (UF) | % aprobado | Estado    |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|
| 1  | Cálculo      | Refuerzo de muros perimetrales del proyecto                    | 240,55          | 91,90         | 38%        | Aprobado  |
| 2  | Cálculo      | Cambio de hormigón de G20 a G25                                | 731,44          | 0,00          | —          | Eliminado |
| 3  | Cálculo      | Demolición de viga de contención y fundación de muro medianero | 200,39          | 181,62        | 91%        | Aprobado  |

| N°         | Especialidad       | Concepto                                                 | Presentado<br>(UF) | Aprobado<br>(UF) | %<br>aprobado | Estado    |
|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------|
| 4          | Arquitectura       | Cambio de cantería de baño por cornisa                   | -29,65             | -32,62           | —             | Aprobado  |
| 5          | Mecánica de suelos | Sobreexcavación y rellenos en fundaciones                | 161,40             | 0,00             | —             | Rechazado |
| 6          | Cálculo            | Modificación de losa del 1° subterráneo                  | 363,00             | 345,26           | 95%           | Aprobado  |
| 7          | Sanitario          | Empalme UD y alcantarillado                              | 184,07             | 184,07           | 100%          | Aprobado  |
| 8          | Sanitario          | Estanque de agua de bomberos                             | 412,70             | 210,27           | 51%           | Aprobado  |
| 9          | Impermeabilización | Junta de dilatación de piscina                           | 40,96              | 40,96            | 100%          | Aprobado  |
| 10         | Sala de ventas     | Motor de cortina de sala de ventas                       | 59,21              | 59,21            | 100%          | Aprobado  |
| 11         | Arquitectura       | Cambio de tina a receptáculo en deptos. tipo 1, 3, 5 y 8 | 507,32             | 507,32           | 100%          | Aprobado  |
| 12         | Gastos generales   | Costo directo de obras extraordinarias N° 5 y N° 9       | 1.500,00           | 212,68           | 14%           | Aprobado  |
| 13         | Bomberos           | Estanque de agua de bomberos                             | 421,70             | 38,63            | 9%            | Aprobado  |
| 14         | Gastos generales   | Costos directos OO.AA. 05 y 09                           | 56,87              | 42,16            | 74%           | Aprobado  |
| 15         | Arquitectura       | Varios ventanas                                          | 242,52             | 242,52           | 100%          | Aprobado  |
| 16         | Arquitectura       | Alarma de ventanas de dormitorios piso 2                 | 37,71              | 37,71            | 100%          | Aprobado  |
| 17         | Ventas             | Cierre de seguridad sala de ventas                       | 14,89              | 14,89            | 100%          | Aprobado  |
| 18         | Ventas             | Sala de ventas                                           | 126,31             | 126,31           | 100%          | Aprobado  |
| 19         | Arquitectura       | Ventanas locales 9 al 13                                 | 35,88              | 35,88            | 100%          | Aprobado  |
| Total neto |                    |                                                          | 5.307,27           | 2.338,77         | 44%           |           |

Montos netos en UF. Al aprobado neto se suma IVA (444,37 UF) y se descuenta el crédito CEEC (288,84 UF), para un total de 2.494,30 UF.

### Estados de pago de obras adicionales

| Documento      | Fecha      | Factura | Neto (UF) | IVA   | Crédito CEEC | Total (UF) |
|----------------|------------|---------|-----------|-------|--------------|------------|
| EEPP OO.AA. 01 | 23-06-2025 | 40770   | 45,95     | 8,73  | -5,67        | 49,01      |
| EEPP OO.AA. 02 | 29-08-2025 | 40985   | 90,81     | 17,25 | -11,22       | 96,85      |
| EEPP OO.AA. 03 | 24-10-2025 | 41211   | 136,76    | 25,98 | -16,89       | 145,85     |
| EEPP OO.AA. 04 | 20-11-2025 | 41350   | 345,26    | 65,60 | -42,64       | 368,22     |

| Documento      | Fecha      | Factura | Neto (UF) | IVA    | Crédito CEEC | Total (UF) |
|----------------|------------|---------|-----------|--------|--------------|------------|
| EEPP OO.AA. 05 | 16-04-2026 | 41796   | 184,07    | 34,97  | -22,73       | 196,31     |
| EEPP OO.AA. 06 | 20-07-2026 | 42274   | 216,67    | 41,17  | -26,76       | 231,08     |
| EEPP OO.AA. 07 | 20-08-2026 | 42373   | 939,83    | 178,57 | -116,07      | 1.002,33   |
| EEPP OO.AA. 08 | 20-09-2026 | 42497   | 160,37    | 30,47  | -19,81       | 171,03     |
| Total          |            |         | 2.119,72  | 402,75 | -261,79      | 2.260,68   |

## Requerimientos de información (RDI)

De 324 RDI emitidas, 311 están resueltas (96,0%). Quedan 13 pendientes de respuesta.

● Verde: cierre de RDI

|               |                      |                |          |
|---------------|----------------------|----------------|----------|
| RDI emitidas  | Resueltas            | Pendientes     | Nulas    |
| <b>324</b>    | <b>311</b>           | <b>13</b>      | <b>0</b> |
| Al 30-09-2026 | Tasa de cierre 96,0% | 4,0% del total |          |

### Estado de las RDI

|            |             |                  |
|------------|-------------|------------------|
| Resueltas  | <div></div> | <b>311</b> 96,0% |
| Pendientes | <div></div> | <b>13</b> 4,0%   |
| Nulas      | <div></div> | <b>0</b> 0,0%    |

## Calidad y seguridad

Se terminó la revisión de impermeabilización del piso 8, se recibieron en R0 14 departamentos del piso 3 y se resolvieron en terreno las observaciones a cornisas de pasillos comunes. Hubo un accidente con 7 días perdidos.

## Revisiones de calidad del período

- Se termina la revisión de impermeabilización del piso 8 y se inicia la del piso 10.
- Se realiza la recepción R0 de departamentos del piso 3, con 14 departamentos revisados al 29-09.
- Se revisan y solucionan en terreno, junto a arquitectura, las observaciones a cornisas de pasillos comunes.
- Se solicita a la constructora revisar las terminaciones de junquillos y sellos de puertas correderas.

## Seguridad e higiene

Accidentes en el mes

**1**

Septiembre 2026

Días perdidos en el mes

**7**

Accidentes acumulados

**2**

Desde el inicio de la obra

Días perdidos acumulados

**7**

El 08-09 se accidenta un carpintero mientras desarmaba un andamio, con 7 días perdidos. A la fecha la obra registra dos accidentes y 7 días perdidos.

## Hitos y hechos relevantes

La obra gruesa terminó el 23-04-2026, 48 días antes de la fecha programada (10-06-2026). La recepción provisoria aún no tiene fecha informada por la constructora.

## Hitos contractuales



Los hitos rellenos están cumplidos y se ubican en su fecha real. Los hitos en azul tienen fecha comprometida anterior al cierre del período, sin fecha real registrada en el informe.

## Hechos relevantes de septiembre 2026

|       |            |                                                                                                             |   |    |   |       |  |
|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|-------|--|
| 01-09 |            | 1                                                                                                           | 2 | 34 | 5 | 30-09 |  |
| 1     | 09-09-2026 | Se adjudican a la empresa GEN las obras del proyecto SERVIU.                                                |   |    |   |       |  |
| 2     | 20-09-2026 | Se presentan el estado de pago N° 20 y el estado de pago N° 08 de obras adicionales.                        |   |    |   |       |  |
| 3     | 23-09-2026 | Se informan 100% subsanadas las observaciones de Metrogas al interior del edificio.                         |   |    |   |       |  |
| 4     | 23-09-2026 | Se aprueban el porcelanato Shellstone Bianco (piscina) y el piso Polinwood con guardapolvo gris (bomberos). |   |    |   |       |  |
| 5     | 29-09-2026 | Termina la configuración de tabiquería interior de los departamentos del piso 12.                           |   |    |   |       |  |

## Registro fotográfico al 30-09-2026

8 fotografías del período. Las comparaciones muestran el mismo frente al inicio y al final del mes. Seleccione una foto para ampliarla.

### Avance durante el mes

#### Fachada interior



Inicio del mes



Final del mes

Cubierta



Inicio del mes




Final del mes

Faenas del período




**Pisos 6 y 7**  
Instalación de muebles de cocina

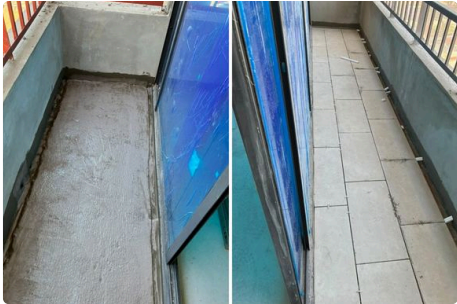

**Pisos 9 y 10**  
Impermeabilización y cerámica de terrazas



**Piso 1**  
Tabiquería de locales y sector bomberos

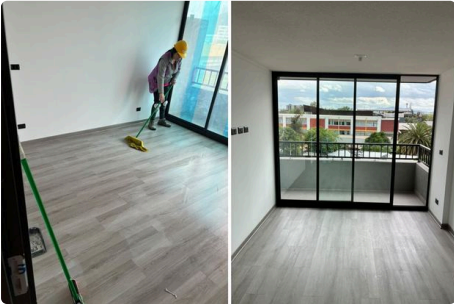

**Piso 4**  
Terminación de departamentos



INSPECCIÓN TÉCNICA  
DE OBRAS

**GIP Inspección Técnica de Obras**

Av. Vitacura 5250, oficina 507, Vitacura, Santiago

contacto@gip.cl

**Informe ejecutivo N° 19, revisión 0**

Edificio Carrera (GIP\_228)

Período septiembre 2026, cierre 30-09-2026
